Terminplan

STEK 2050 Burgdorf

15.01.2026

Leistung	Lead, Teilnehmende
Projektinitiierung	
Definition Prozess und Aufbauorganisation	
Definition Meilensteine und Termine	
Projekthandbuch erarbeiten	
BauPlaKo	
Gemeinderat	
Geschäftsprüfungskommission	
Stadtrat	
A: Mini-Tenderverfahren Fachbegleitung(en)	
Mini-Tenderverfahren Fachbegleitung Kommunikation & Partizipation (Los 4)	
• Aufbereitung Ausschreibungsunterlagen Mini-Tenderverfahren für Fachbegleitung Kommunikation & Partizipation (Los 4)	PLe
• Organisation und Durchführung Mini-Tenderverfahren Los 4	GPL
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Vorschlag Auftragsvergabe)	PLi, SG
• Auftragsvergabe	PLi
Mini-Tenderverfahren Planungsteam (Los 1 & 2)	
• Aufbereitung Ausschreibungsunterlagen Mini-Tenderverfahren für Planeteam (Los 1 und 2)	PLe
• Organisation und Durchführung Mini-Tenderverfahren Los 1 und 2	GPL
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Vorschlag Auftragsvergabe)	PLi, SG
• Auftragsvergabe	PLi
Phase 1: Analyse und Leitideen	
Start mit Fachbegleitungen Kommunikation & Partizipation, sowie Planungsteam	
• Prozessstart mit Fachbegleitung Partizipation und Kommunikation, sowie Planungsteam	**GPL**, PT, KP
• Finale Prozessdefinition und Erarbeitung Partizipations- und Kommunikationskonzept inkl. Stakeholderanalyse, Definition einzubeziehende Stakeholder / finale Akteure ie Gefässe	GPL, **KP**
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung finaler Prozess inkl. Partizipations und Kommunikationskonzept, mit Stakeholderanalyse, Besetzung	PLi, SG
Grundlagen, Analyse und Mitwirkung Quartierleiste	
• Fachliche Analysen zu unterschiedlichen Themenfelder (Grundlagenarbeit, erste räumliche Analysen)	PT
• G: Kick-Off Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Prozessstart, Information, Grundlagenwissen abholen und Spiegelung Analyse/ erste Leitideen)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Koordinationssitzung Region/ Kanton	GPL **(PLi)**, RK
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf fachliche Analysen, Mitwirkungsformat Quartierleiste, Definition fehlende Grundlagen)	PLi, SG
• G: Mitwirkungsformat Quartierleiste (Konsultation Bedürfnisse, Meinungen und Ideen)	**KP**, QL, ggf. PT
Entwicklung Leitideen	
• Erarbeitung und Beschrieb Leitideen auf Basis Grundlagen, sowie erste räumliche Analysen und Mitwirkung	PT
• G: Workshop Querdenkende (Spiegeln und Weiterentwicklung Entwurf Leitideen)	GPL **(PLe)**, PT, QD
Grundlagenlücke schliessen auf Basis der Leitideen	
• Organisation fehlender Grundlagen unter Einbezug von Experti/-innen	**GPL**, EX
• G: Arbeitssitzung Experti-/innen	**GPL**, EX
Konstituierung Stakeholdergruppen	
• Aufbau mitwirkende Akteursgruppen aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen: Stammtisch Interessenvertretende, Realo/Kanton, Quartiere	KP
• G: Kick-Off Stammtisch Interessenvertretende (Prozessstart, Information und Spiegelung Analyse und erste Leitideen)	**KP**, GPL, PT, IV
Leitideen vertiefen	
• Leitideen vertiefen inkl. Realitäts-Check	PT
• Kernbotschaften je Leitidee formulieren	PT
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung vertiefte Leitideen/ Kernbotschaften)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung vertiefte Leitideen und	PLi, SG
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand und Spiegelung vertiefte Leitideen/ Kernbotschaften)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften» erarbeiten	
• Überarbeitung und Finalisierung Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften (Text, Plan, 3D o.ä.)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften»)	PLi, SG
Abschluss Phase 1	
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Phase 1, Auslösung Phase 2)	PLi, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung Phase 1, Ausblick Phase 2)	**PLi**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL **(PLe)**
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP
Phase 2: Räumliches Zielbild	
Synthese aus den verräumlichten Leitideen inkl. strategische Stossrichtungen	PT
• Darstellung der Synthese in geeigneter Form	PT
• Formulierung von strategischen Stossrichtungen	PT, GPL
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf Synthese)	PLi, SG
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung Synthese)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand, Spiegelung Synthese)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Räumliches Zielbild mit strategischen Stossrichtungen» erarbeiten	PT
• Überarbeitung und Finalisierung Zielbild mit strategischen Stossrichtungen (Text/ Plan/ 3D o.ä.)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Räumliches Zielbild mit strategischen Stossrichtungen»)	PLi, SG
Abschluss Phase	GPL
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Phase 2, Auslösung Phase 3)	PLi, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung Phase 2, Ausblick Phase 3)	**PLi**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP
Phase 3: Massnahmen	
Massnahmen mit Hinweis zu geeigneten Instrumenten formulieren	PT
• Massnahmen ableiten, Hinweise zu geeigneten Instrumenten, ggf. Priorisierung von Massnahmen	PT, GPL
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf Massnahmen)	PLi, SG
• G: Workshop Querdenkende (Spiegelung und Ergänzung Entwurf Massnahmen)	GPL, QD, PT
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung Massnahmen)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Koordinationssitzung Region / Kanton	GPL **(PLi)**, RK
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand, Spiegelung Massnahmen)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Massnahmenkatalog» erarbeiten	PT
• Überarbeitung und Finalisierung Massnahmenkatalog (Text/ Liste)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Massnahmenkatalog»)	PLi, SG
Abschluss Phase 3	GPL
• G: Steuerungssitzung (zusammen mit Abschluss Phase 4)	PLi, SG
• G: Gemeinderatssitzung (zusammen mit Abschluss Phase 4)	**PLi**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
Phase 4: Verabschiedung STEK 2050	
Resultat «STEK 2050» erarbeiten	PT
• Aufbereitung des STEK 2050	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «STEK 2050»)	PLi, SG
Abschluss Phase 4	GPL
• G: Steuerungssitzung (Verabschiedung STEK 2050 inkl. Massnahmenkatalog, Ausblick Öffentlichkeitsarbeit)	PLi, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung STEK 2050 inkl. Massnahmenkatalog, Ausblick Öffentlichkeitsarbeit)	**PLi**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP

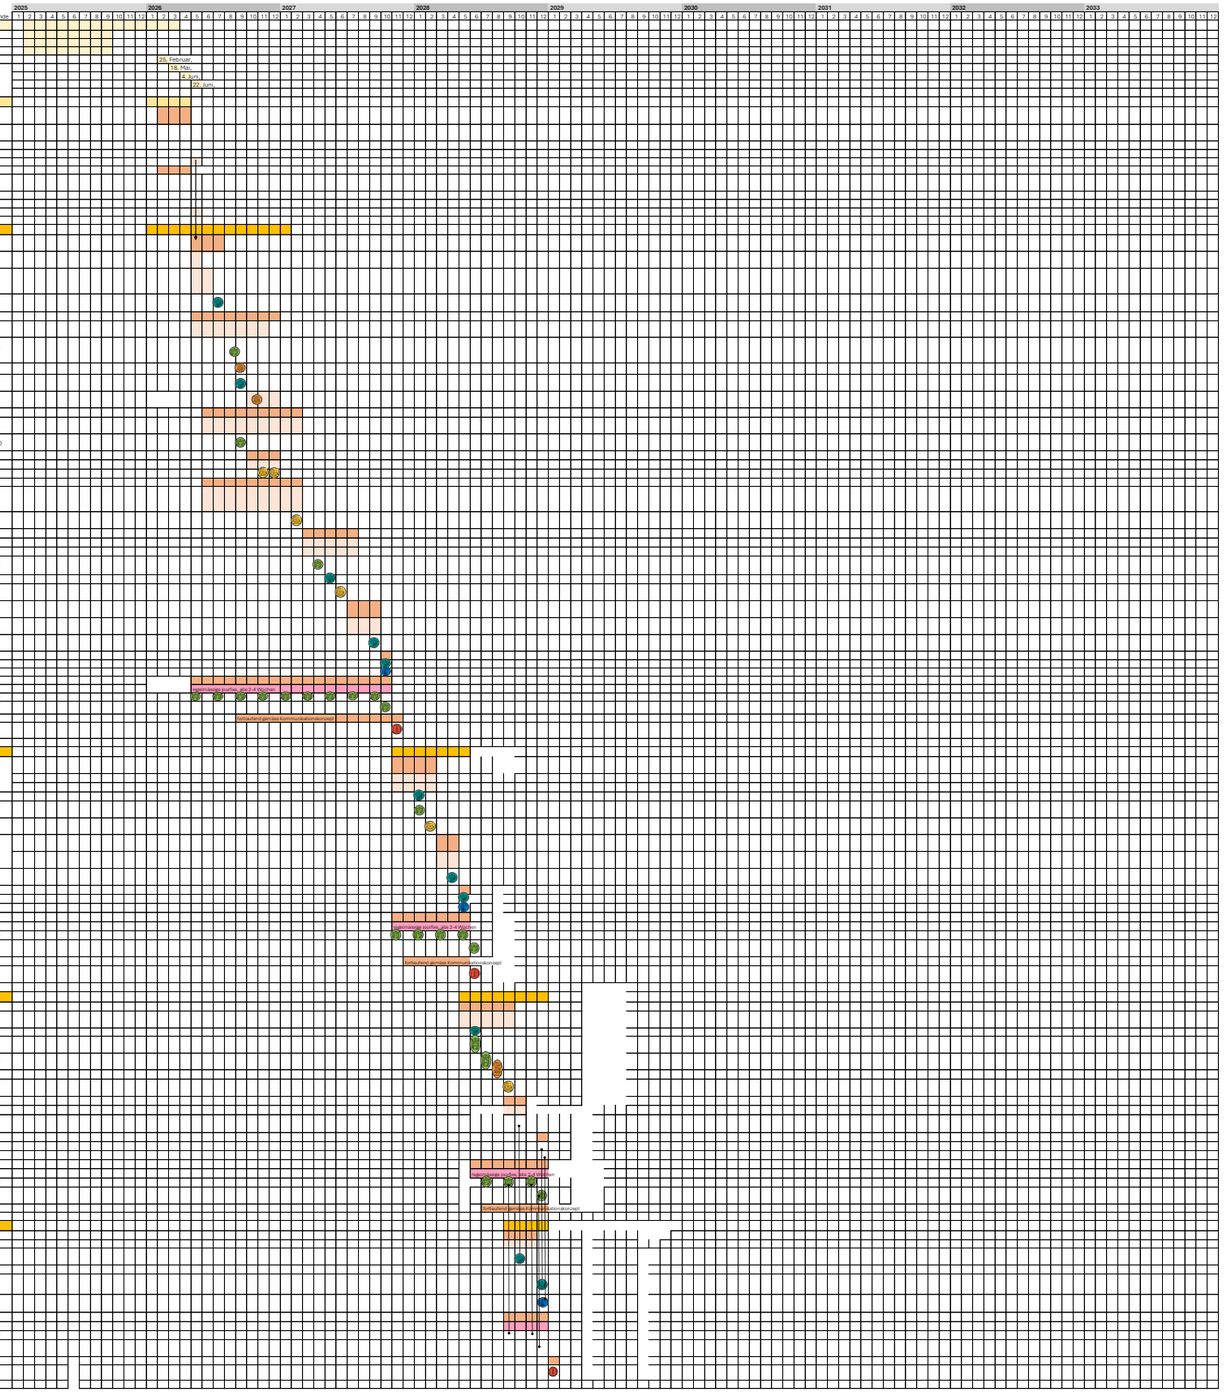

Abkürzungen:

GPL Gesamtprojektleitung
PLi Projektleitung intern
PLe Projektleitung extern
SG Steuergruppe
SB Stadtinterne Begleitgruppe
EX Experti/innen
PT Planungsteam
KP Externe Begleitung Kommunikation und Partizipation
IV Interessenvertretende Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik
