Terminplan (dargestellt ist Variante B, Variante A + ca. 3 Monate)
STEK 2050 Burgdorf
14.07.2026

Leistung	**Lead**, Teilnehmende
Projektinitiierung	
Definition Prozess und Aufbauorganisation	
Definition Meilensteine und Termine	
Projekthandbuch erarbeiten	
Steuergruppe	
BauPlaKo	
Gemeinderat	
Geschäftsprüfungskommission	
Stadtrat	
A: Mini-Tenderverfahren Fachbegleitung(en)	
Phase 1: Analyse und Leitideen	
Start mit Fachbegleitungen Kommunikation & Partizipation, sowie Planungsteam	
• Prozessstart mit Fachbegleitung Partizipation und Kommunikation, sowie Planungsteam	**GPL**, PT, KP
• Finale Prozessdefinition und Erarbeitung Partizipations- und Kommunikationskonzept inkl. Stakeholderanalyse, Definition einzubeziehende Stakeholder / finale Akteure je Gefässe	GPL, **KP**
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung finaler Prozess inkl. Partizipations- und Kommunikationskonzept, mit Stakeholderanalyse, Besetzung Gefässe)	PLL, SG
Grundlagen und Analyse	
• Fachliche Analysen zu unterschiedlichen Themenfelder (Grundlagenarbeit, erste räumliche Analysen)	PT
• G: Kick-Off Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Prozessstart, Information, Grundlagenwissen abholen und Spiegelung Analyse/ erste Leitideen)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Koordinationssitzung Region/ Kanton	GPL **(PLL)**, RK
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf fachliche Analysen, Definition fehlende Grundlagen)	PLL, SG
Entwicklung Leitideen	
• Erarbeitung und Beschrieb Leitideen auf Basis Grundlagen, sowie erste räumliche Analysen und Mitwirkung	PT
• G: Workshop Echogruppe (Spiegeln und Weiterentwicklung Entwurf Leitideen)	GPL **(PLe)**, PT, EG
Grundlagenlücke schliessen auf Basis der Leitideen	
• Organisation fehlender Grundlagen unter Einbezug von Experti-innen	**GPL**, EX
• G: Arbeitssitzung Experti-innen	**GPL**, EX
Konstituierung Stakeholdergruppen	
• Aufbau mitwirkende Akteursgruppen aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen: Stammtisch Interessenvertretende, Region/Kanton	KP
Leitideen vertiefen	
• Leitideen vertiefen inkl. Realitäts-Check	PT
• Kernbotschaften je Leitidee formulieren	PT
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung vertiefte Leitideen/ Kernbotschaften)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung vertiefte Leitideen und Kernbotschaften)	PLL, SG
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand und Spiegelung vertiefte Leitideen/ Kernbotschaften)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften» erarbeiten	
• Überarbeitung und Finalisierung Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften (Text, Plan, 3D o.ä.)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Analyse und verräumlichte Leitideen mit Kernbotschaften»)	PLL, SG
Abschluss Phase 1	
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Phase 1, Auslösung Phase 2)	PLL, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung Phase 1, Ausblick Phase 2)	**PLL**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL **(PLe)**
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP
Phase 2: Räumliches Zielbild	
Synthese aus den verräumlichten Leitideen inkl. strategische Stossrichtungen	PT
• Darstellung der Synthese in geeigneter Form	PT
• Formulierung von strategischen Stossrichtungen	PT, GPL
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf Synthese)	PLL, SG
• G: Workshop Echogruppe (Spiegelung erster Entwurf Synthese)	GPL **(PLe)**, PT, EG
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung Synthese)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand, Spiegelung Synthese)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Räumliches Zielbild mit strategischen Stossrichtungen» erarbeiten	PT
• Überarbeitung und Finalisierung Zielbild mit strategischen Stossrichtungen (Text/ Plan/ 3D o.ä.)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Räumliches Zielbild mit strategischen Stossrichtungen»)	PLL, SG
Abschluss Phase	GPL
• G: Steuerungssitzung (Genehmigung Phase 2, Auslösung Phase 3)	PLL, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung Phase 2, Ausblick Phase 3)	**PLL**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP
Phase 3: Massnahmen	
Massnahmen mit Hinweis zu geeigneten Instrumenten formulieren	PT
• Massnahmen ableiten, Hinweise zu geeigneten Instrumenten, ggf. Priorisierung von Massnahmen	PT, GPL
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung erster Entwurf Massnahmen)	PLL, SG
• G: Workshop Echogruppe (Spiegelung und Ergänzung Entwurf Massnahmen)	GPL, EG, PT
• G: Workshop stadtinterne Begleitgruppe (Information Prozessstand, Spiegelung Massnahmen)	GPL **(PLe)**, SB, PT
• G: Koordinationssitzung Region / Kanton	GPL **(PLL)**, RK
• G: Stammtisch Interessenvertretende (Information Prozessstand, Spiegelung Massnahmen)	**KP**, GPL, PT, IV
Resultat «Massnahmenkatalog» erarbeiten	PT
• Überarbeitung und Finalisierung Massnahmenkatalog (Text/ Liste)	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «Massnahmenkatalog»)	PLL, SG
Abschluss Phase 3	GPL
• G: Steuerungssitzung (Veranschiedung Massnahmenkatalog)	PLL, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Veranschiedung Massnahmenkatalog)	**PLL**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
Phase 4: Verabschiedung STEK 2050	
Resultat «STEK 2050» erarbeiten	PT
• Aufbereitung des STEK 2050	PT
• G: Steuerungssitzung (Spiegelung Inhalte während Erarbeitung Resultat «STEK 2050»)	PLL, SG
Abschluss Phase 4	GPL
• G: Steuerungssitzung (Verabschiedung STEK 2050 inkl. Massnahmenkatalog, Ausblick Öffentlichkeitsarbeit)	PLL, SG
• G: Gemeinderatssitzung (Verabschiedung STEK 2050 inkl. Massnahmenkatalog, Ausblick Öffentlichkeitsarbeit)	**PLL**, GR
Fortlaufende Koordination und Steuerung Prozess	GPL
• G: Jourfixe Gesamtprojektleitung	GPL
• G: Arbeitsbesprechung Kernteam	GPL **(PLe)**, PT, KP
• G: Koordinationssitzungen Kommunikation & Partizipation (Koordination Kommunikation & Partizipation)	GPL **(PLe)**, KP
Prozessbegleitende Kommunikation	
• Information aller beteiligter Stakeholdergruppen gemäss Kommunikationskonzept	KP

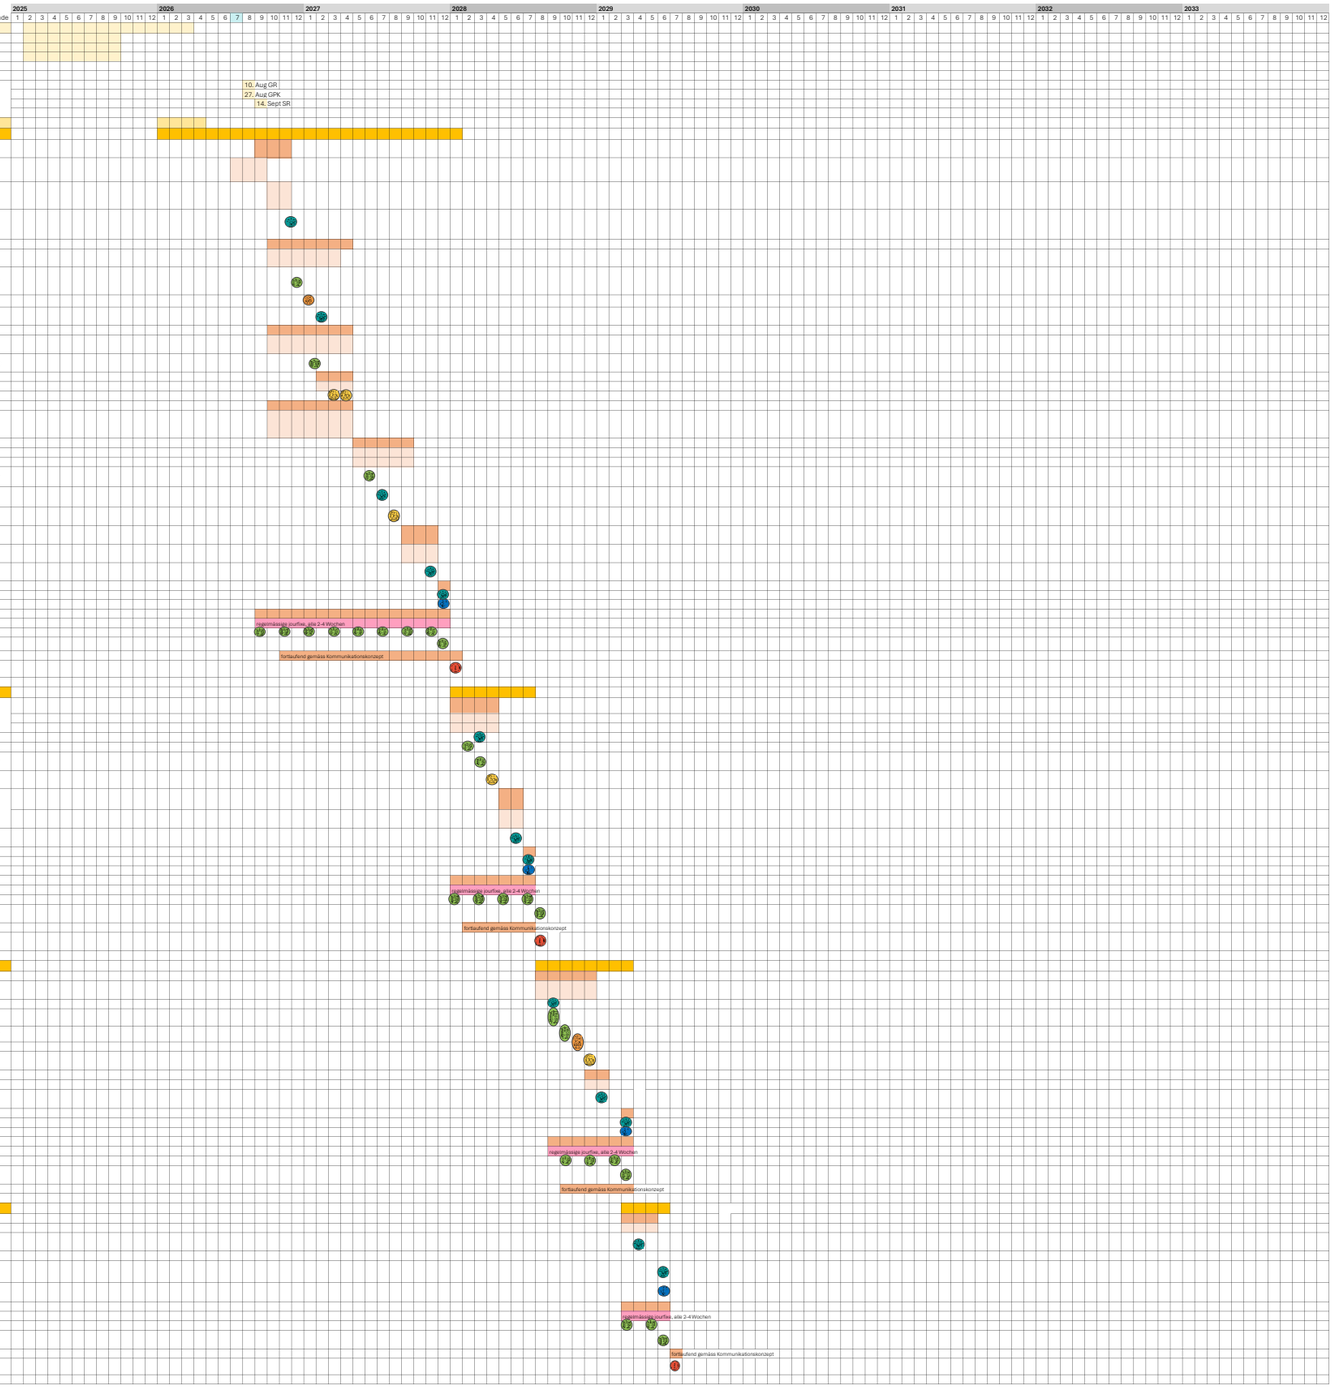

Abkürzungen:
GPL Gesamtprojektleitung
PLI Projektleitung intern
PLe Projektleitung extern
SG Steuergruppe
SB Stadtinterne Begleitgruppe
EX Expertinnen
PT Planungsteam
KP Externe Begleitung Kommunikation und Partizipation
IV Interessensvertretende Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik
